

**澧县永丰加油站建设项目
竣工环境保护验收监测报告表**

精检竣监 [2020] 075 号

**建设单位：澧县永丰加油站
编制单位：湖南精科检测有限公司**

2020 年 05 月

建设单位法人代表：唐直义

编制单位法人代表：昌小兵

项目负责人：唐欢平

填 表 人 ：周毅

建设单位 _____（盖章）

电话:13342561671

传真:/

邮编:415521

地址:湖南省澧县如东镇梅家港居
委会梅家港路 55 号

编制单位 _____（盖章）

电话:0731-86953766

传真:0731-86953766

邮编:410000

地址:长沙市雨花区环保中路 188
号

声明：复制本报告中的部分内容无效。



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：181812051320

名称：湖南精科检测有限公司

地址：长沙市雨花区振华路 519 号聚合工业园 16 栋 604-605

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由湖南精科检测有限公司承担。

许可使用标志



181812051320

发证日期：2019 年 09 月 29 日

有效期至：2024 年 02 月 08 日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

表一

建设项目名称	澧县永丰加油站建设项目				
建设单位名称	澧县永丰加油站				
建设项目性质	新建（补办环评手续）				
建设地点	湖南省澧县如东镇梅家港居委会梅家港路 55 号				
主要产品名称	零售柴油、汽油成品油				
设计生产能力	年零售石油 65 吨，其中 0 号柴油 25 吨，92 号汽油 40 吨				
实际生产能力	年零售石油 65 吨，其中 0 号柴油 25 吨，92 号汽油 40 吨				
建设项目环评时间	2019.10	开工建设时间 /竣工日期	/		
调试时间	/	验收现场监测时间	2020.4.15~2020.4.16		
环评报告表 审批部门	常德市生态环境局澧 县分局 常环建（6） [2020]33 号 2020 年 4 月 9 日	环评报告表 编制单位	湖南大自然环保科技有限公司		
环保设施设计 单位	/	环保设施施工单位	/		
投资总概算	60 万元	环保投资总概算	15 万元	比例	25%
实际总概算	60 万元	环保投资	15 万元	比例	25%
验收监测依 据	(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1） (2) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26 修正） (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1） (4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7 修正） (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018 修正版）》（2018.12.29） (6) 《中华人民共和国环境影响评价法（2018 修正版）》（2018.12.29） (7) 《建设项目环境保护管理条例》（2017.6.21 修订，2017.10.1 实施） (8) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20） (9) 《环境保护设施竣工验收监测办法》（环监[1995]335 号） (10) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》2018.5.15 (11) 湖南大自然环保科技有限公司《澧县永丰加油站建设项目环境影响报告表》2020.4 (12) 常德市生态环境局，常环建（6）[2020]33 号《常德市生态环境局关于澧县永丰加油站建设项目环境影响报告表的批复》2020.4.9				

验收监测
评价标
准、标
号、级
别、限值

一、执行标准

根据常德市生态环境局澧县分局，以常环建（6）[2020]33号《常德市生态环境局关于澧县永丰加油站建设项目环境影响报告表的批复》的要求，经现场勘查、研究，该项目环保验收监测执行标准如下：

（一）环境质量标准

1、环境空气质量标准

根据大气环境功能区划，项目所在地属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；对于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）未包含的建设项目特征污染物，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。

表 1-1 环境空气质量标准 单位：ug/m³

污染物	环境质量标准		标准来源
	取值时间	浓度限值(ug/m ³)	
SO ₂	年平均	60	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；
	日均值	150	
	1小时均值	500	
NO ₂	年平均	40	
	日均值	80	
	1小时均值	200	
CO	日均值	4mg/m ³	
	1小时均值	10mg/m ³	
O ₃	日最大8小时均值	160	
	1小时均值	200	
PM ₁₀	日均值	150	
	年平均值	70	
PM _{2.5}	年平均值	35	
	日均值	75	
	年平均值	200	
非甲烷总烃	1小时平均	2000	《大气污染物综合排放标准详解》

2、地表水环境质量标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表 1-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）

项目	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	石油类	NH ₃ -N	TP	SS
III类标准限值	6~9	≤20	≤4	≤0.05	≤1.0	≤0.2	≤30*

注：*SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。

3、声环境质量标准

本项目所在区域边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表 1-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）

时段 声环境功能区类别	昼间	夜间
2类	60dB（A）	50dB（A）

（二）污染物排放标准

1、废水排放标准

本项目综合废水执行《污水综合排放标准》表 4 一级标准，具体见表 1-4。

表 1-4 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH 除外

污染物	pH	BOD ₅	COD _{Cr}	SS	NH ₃ -N	石油类
一级标准	6-9	≤20	≤100	≤70	≤15	≤5

2、废气排放标准

本项目加油站油气排放限值、控制技术要求等执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）规定要求（处理装置的油气排放浓度应小于等于 25g/m³，排放口距地平面高度应不低于 4m）；非甲烷总烃厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值，有关污染物及其浓度限值见下表。

表 1-5 本项目大气污染物排放标准

标准	污染物	无组织排放监控浓度限值	
GB16297-1996	非甲烷总烃	周界外浓度最高点	4.0

3、噪声排放标准

运营期：项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见下表。

表 1-6 工业企业厂界噪声限值 单位：dB(A)

标准	昼间	夜间
2类	60	50

4、固体废物排放标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-2008）。

（三）总量控制标准

根据环评及环评批复文件要求，本项目不设置总量控制指标。

二、验收监测范围

本次验收范围为：澧县永丰加油站建设项目的主体工程（包括加油岛、罩棚、储罐区）、辅助工程（站房、危废间、隔油沉淀池等）及废水、废气、噪声、固废环保设施的建设、调试、管理及其效果和污染物排放等情况开展的查验、监测等环境影响评价报告和批复规定的环境保护措施全部内容。

表二

一、工程建设内容:

澧县永丰加油站位于湖南省澧县如东镇梅家港居委会梅家港路 55 号，北纬 29.689161，东经 111.938136，于 2007 年建成投产，现建设单位主动补办环境影响评价手续。该加油站总投资 60 万元，用地面积为 600m²，建筑面积 261m²。加油站设卸油及加油油气回收系统，站区设加油机 2 台，其中 0#柴油和 92#汽油加油机为两枪。埋地油罐 2 个（其中一个 30m³ 为柴油油罐，另一个 30m³ 为汽油油罐），折合汽油油罐总容积为 45m³（柴油罐容积折半计算），年销油量约 65 吨（其中汽油 40 吨）。

本项目由业主自主组织验收，业主委托湖南精科检测有限公司进行验收监测。湖南精科检测有限公司于 2020 年 4 月 15 日~16 日对项目进行验收监测，经现场核实，本项目建设内容（工程组成）如下：

1、项目建设内容

表 2-1 项目建设内容一览表

工程类别	项目名称	建设内容及规模	验收阶段对比分析
主体工程	加油岛	设 2 台单枪油气回收型加油机；地面水泥硬化	一致
	罩棚	钢架结构，投影面积 121m ² ，高 8m	一致
	储罐区	30m ³ 汽油罐 1 个（双层防腐罐）、30m ³ 柴油罐 1 个（双层防腐罐），配套钢筋混凝土防渗池	一致
辅助工程	站房	建筑面积 110m ² ，两层砖混结构主要设置便利店、办公室、休息室	一致
	辅助用房	一层砖混结构，主要为配电间、发电间，建筑面积为 30m ²	一致
	安全防护	设静电接地系统并设专用静电接地报警器，储油罐防雷防静电接地与电气设备的工作、保护接及信息系统的接地宜共用接地装置；实体围墙砖混结构，墙高 2.0m	一致
公用工程	给水	从自来水管接入	一致
	排水	项目生活污水经化粪池处理后回用于周边农田灌溉；场地清洗废水经隔油沉淀池处理后由雨水沟汇入西侧沟渠	一致
	供电系统	从农村电网电源引至站内配电室。设配电室、柴油发电机组	一致

	消防	加油区配置不少于 2 具 4kg 手提式干粉灭火器 2 台加油机，或 1 具 4kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器；地下储罐区应配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器；配置灭火毯不少于 2 块、沙子 8m ³ 消防砂箱	一致
环保工程	废水	生活污水经化粪池预处理回用于周边农田；场地冲洗废水经隔油沉淀池处理达标后经雨水沟排入西侧沟渠，最终进入污水	一致
	废气	安装卸油油气回收装置、分散式加油油气收系统一套；渗漏检测在线监测系统	一致
	固废	生活垃圾交由环卫部门统一清运处理，日产日运；隔油池废油、含油手套、抹布、含油废渣、清洗废液等危险废物，经收集桶收集后暂存在危废暂存间，定期交由已取得危险废物处置资质的公司进行处置	一致
	噪声	加油站进出口设置限速、禁鸣标志和减速坡，噪声设施安装减噪措施	一致
	地下水	加油岛地面硬化，装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位采取相应的防渗措施，埋地加油管道应采用双层管道并防腐措施；油罐区外周边设置地下水监测井；加油站等的地下油罐应当使用双层罐并采取建造钢筋混凝土防渗池等效措施，并进行防渗监测，防止地下水污染	一致
	风险防范措施	设置紧急切断系统，在事故状态下迅速切断加油泵的电源；油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统；加油岛端部的加油机附近应设防撞柱（栏）；设置消防废水事故应急池（5m ³ ）；制定岗位操作规范；编制突发环境事件应急预案	未设置事故应急池

2、主要生产设备

本项目主要生产设备见表 2-2。

表 2-2 主要生产设备主要生产设备

序号	设备名称	型号	单位	数量	备注
1	92#汽油储罐	30m ³	个	1	埋地，卧式双层防腐罐
2	0#柴油储罐	30m ³	个	1	埋地，卧式双层防腐罐
3	加油机	/	台	2	/
4	全场监控报警系统	/	套	1	/
5	油气回收装置	/	套	1	卸油回收及加油回收
6	渗漏检测在线监测系统	/	套	1	/
7	柴油发电机	/	台	1	3KW

3、燃油经营规模

该站主要经营零售 0#柴油、92#汽油成品油，年销售量为 65t。

表 2-3 燃油经营规模

序号	主要物料名称	用量
1	汽油	40t/a
2	柴油	25t/a

项目建成投产后主要运输物品为柴油和汽油的运入，该项目油品总运量为 65t/a。本项目运行严格建立、执行危险品贮存、运输、发放的管理制度，并建立相应的档案。

4、环保投资

本项目总投资 60 万元，其中环保投资 15 万元，占比 25%，本项目环境保护设施投资见下表 2-4。

表 2-4 环保设施投资一览表

项目名称	费用（万元）	备注	
废水	隔油沉淀池	0.5	/
	化粪池	1	/
	加油区水封隔油措施	1	/
废气	油气回收系统	4	/
噪声	加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；柴油发电机放置在配电房内，并设置减振垫	0.5	/
固废	垃圾收集箱，危险废物暂存间	1	/
防渗漏	防渗防漏措施	5	/
绿化	站内绿化、硬化	2	/
合计		15	

5、工作制度

年工作日为 365 天，2 班制，每班工作 12 小时。

二、主要工艺流程及产物环节

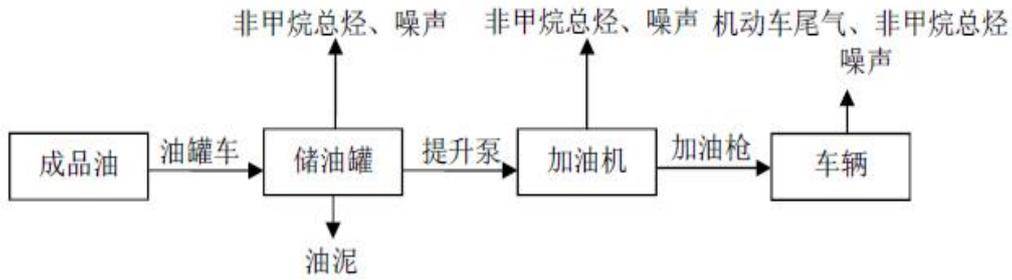


图 2-1 项目工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

(1) 卸油工艺

本加油站采用密闭卸油工艺，油罐车自油库运来至卸油点附近停好后，垫好三角木，挂上警示牌，夹紧静电接地夹，静止 15 分钟，通过软管和导管伸至罐内距罐底 0.2m 处，用快速接头将卸油管 and 地下油罐受油管接通，并接好卸油油气回收管，管连接后开阀自流进油。初始流速控制在 1m/s 以内，卸油时流速应控制在 3m/s，卸油完毕关阀、脱开快速接头及静电接地夹。

(2) 加油工艺

加油时，0#柴油通过自吸泵输送至加油机，92#汽油通过潜油泵输送至加油机，经过加油机自动计量和自封式加油枪注入汽车油箱等受油容器。

三、项目变动情况

通过现场勘查，本项目实际工程建设内容变化如下：

表 2-5 项目变动情况一览表

项目类别	环评阶段工艺与规模	实际执行情况	说明
风险防范措施	设置事故应急池 (5m ³)	未设置事故应急池	采用地埋储罐，并设置有防渗储罐池，罐区泄漏油品可被罐池收集，加油区泄漏油品可由导流沟收集后进入隔油沉淀池

其他工程建设内容与环评批复要求一致，无重大变动情况。

表三

主要污染源、污染物处理和排放

1、废气

本项目运营期产生大气污染物主要为汽车尾气、柴油发电机废气、油罐小呼吸和油气。废气的产生及治理措施见表 3-1。

表 3-1 废气产生及治理措施一览表

序号	排放源	主要污染物	处理措施	排放形式
1	加油、卸油产生废气、储罐呼吸废气	非甲烷总烃	油气回收、油气平衡	呈无组织排放
2	发电机废气	NO _x 、HC	布置在室内	呈无组织排放
3	汽车尾气	CO、NO _x 、THC	室外场地开阔，加强厂区绿化、加油熄火、即停即走不停留，减轻尾气排放	呈无组织排放

2、废水

运营期产生的废水主要为生活污水、场地清洗废水。

废水产生及治理措施情况见表 3-2。

表 3-2 废水产生及治理措施一览表

序号	废水类别	产生量 (t/a)	污染物种类	排放规律	治理设施	去向
1	生活污水	110.96	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮	间断	化粪池	农灌、不外排
2	场地清洗废水	11.616	化学需氧量、悬浮物、石油类	间断	隔油沉淀池	通过西侧沟渠排入泔水

3、噪声

主要噪声产生及治理措施见表 3-3。

表 3-3 主要噪声产生及治理措施一览表

序号	噪声源	声级 dB (A)	治理措施
1	加油泵	70	站区合理布局，加油站进出口设置限速、禁鸣标志和减速坡，高噪声设施采取基础减振措施等。
2	压缩机	85	
3	柴油发电机	90	
4	进出车辆	75	

4、运营期固废

固废产生及治理措施见表 3-4。

表 3-4 固体废物的产生及处理措施一览表

固废名称		固废种类	产生量 (t/a)	处置方式
生活垃圾		生活垃圾	0.547	收集后交当地环卫部门处置
检修废物	含油手套、抹布	危险固废	0.04	加油站油罐清洗均由专业公司清理，清理时产生的油罐废油渣由有资质的单位定期清运处理、处置；建议建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修订单中的相关标准要求设置危废暂存间
	含油废渣	危险固废	0.8	
清罐废物	油渣	危险固废	0.4	
隔油池污泥		危险固废	0.4	收集后交由有危险废物处理资质的单位处置

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

一、《澧县永丰加油站建设项目环境影响报告表》主要结论与建议

(一) 综合结论

本项目性质与周边环境功能区划相符，符合规划布局要求，选址合理可行。本项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，因此本项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把对环境的影响控制在最低限度。在切实落实本评价提出的各项有关环保措施，并确保各种治理设施正常运转的前提下，本项目对周围环境质量的影响不大，对周边环境敏感点不会带来影响，故本项目的选址及建设从环境保护角度分析是可行的。

(二) 建议

- 1、建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。
- 2、加强员工环保意识和安全意识教育，避免因操作原因导致的安全、环保事故的发生。
- 3、建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。
- 4、加强管理，使化粪池、隔油池、加油油气回收等环保设施保持良好的运行状态。

二、审批部门审批决定

**关于澧县永丰加油站建设项目
环境影响报告表的批复**

常环建（6）[2020]33号

澧县永丰加油站：

你单位申报的《澧县永丰加油站建设项目环境影响报告表》和《关于申请环境影响报告表审批的请示》已收悉，公示期间无反对意见。根据该项目环评

报告表结论和专家审查意见，经研究，现批复如下：

一、澧县永丰加油站位于湖南省澧县如东镇梅家港居委会梅家港路 55 号，于 2007 年建成投产。现建设单位主动补办环境影响评价手续，项目地理坐标为北纬 29.689161，东经 111.938136。该加油站主要工程内容包括 1 个罩棚、2 台加油机，储罐区建有 2 个地埋卧式双层防腐罐，并配套建有卧式双层防腐罐防渗池、卸油及加油油气回收系统、以及便利店等公辅工程，现拟增加投资，配套完善相关的环保、风险防范设施。项目总投资 60 万元，其中环保投资 15 万元，总占地面积 600m²，建筑面积 261m²，年零售柴油 25 吨，汽油 40 吨。项目符合国家产业政策，同意办理环评手续。

二、建设单位在项目运营过程中要强化管理，按环评要求认真落实各项环保措施，确保污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1. 营运期废水：项目采用雨污分流制。生活污水经化粪池预处理回用于周边农田，不外排；场地冲洗废水与洗车废水经隔油沉淀池处理达标后通过厂区雨水沟排入西侧沟渠，最终汇入涇水，外排废水满足《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表 4 一级标准。

2. 营运期废气：加强油品运输车辆的管理，严格按规操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。油气回收系统执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值 25g/Nm³ 标准，非甲烷总烃厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

3. 营运期噪声：项目选择低噪声和防爆型设备，采取合理的降噪减振措施。边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

4. 营运期固废：落实各项固废收集处置措施。设置危险废物暂存间，项目运营中产生油罐废渣、隔油池废油等危险固废须集中收集暂存后交由有资质的单位处置；生活垃圾和废弃含油抹布集中收集后交由当地环卫部门处理。

5. 做好环境风险事故防范措施，加强运输、贮存、运营过程中的安全管理工作，采取防渗漏和防渗漏检测措施。建立应急机构和风险防范体系，制定事故风险防范措施和切实可行的环境风险应急预案，建立健全各项环境管理制

度，减少事故率，降低事故危害程度。

三、项目竣工后，你公司要按照环保部规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并向社会公开，合格后方可投入生产或使用。

常德市生态环境局澧县分局

2020年4月9日

三、项目环评批复要求及落实情况一览表

表 4-1 项目环评批复要求及落实情况一览表

编号	环评及批复要求	落实情况	对比分析
1	<p>营运期废水：项目采用雨污分流制。生活污水经化粪池预处理后回用于周边农田灌溉，不外排；场地冲洗废水与洗车废水经隔油沉淀池处理达标后，通过西侧沟渠排入涇水，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准。</p>	<p>项目采用了雨污分流制，建设了雨水导流沟。项目生活污水经化粪池预处理后回用于周边农田灌溉，不外排；清洗废水经隔油沉淀池处理达标后外排，经现场监测结果表明，项目外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准，可以做到达标排放。</p>	一致
2	<p>营运期废气：加强油品运输车辆的管理，严格按规操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。油气回收系统执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值 25g/Nm³ 标准，非甲烷总烃厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。</p>	<p>营运期废气：企业通过加强油品运输车辆的管理，并严格按规操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并建立了台账。企业进行了油气回收系统的检测，并检测达标，经过现场监测，项目厂界非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。</p>	一致
3	<p>项目选择低噪声和防爆型设备，采取合理的降噪减振措施。边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类。</p>	<p>项目选用了低噪声和防爆型设备，采取了合理的降噪减振措施。经现场监测，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值要求。</p>	一致
4	<p>落实各项固废收集处置措施。设置危险废物暂存间，项目运营中产生油罐废渣、隔油池废油等危险固废须集中收集暂存后交由有资质的单位处置；生活垃圾和废弃含油抹布集中收集后交由当地环卫部门处理。</p>	<p>企业落实了各项固废收集处置措施。设置了危险废物暂存间，集中收集油罐废渣、隔油池废油等危险固废，并签订了危废协议，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾和废弃含油抹布集中收集后交由当地环卫部门处理。</p>	一致

5	<p>做好环境风险事故防范措施，加强运输、贮存、运营过程中的安全管理工作，采取防渗漏和防渗漏检测措施。建立应急机构和风险防范体系，制定事故风险防范措施和切实可行的环境风险应急预案，建立健全各项环境管理制度，减少事故率，降低事故危害程度。</p>	<p>企业做好了环境风险事故防范措施，加强了运输、贮存、运营过程中的安全管理工作，采取了防渗漏和防渗漏等检测措施。建立了应急机构和风险防范体系，制定了事故风险防范措施和切实可行的环境风险应急预案并备案，建立健全了各项环境管理制度。</p>	一致
---	--	---	----

表 4-2 “三同时”验收要求落实情况一览表

类型	验收内容				验收阶段落实情况
	污染源	验收因子	环保措施	验收标准	
大气污染防治	加油卸油工序	非甲烷总烃	采用密闭卸油装置	加油设施执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)及厂界执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	已落实
水污染防治	生活污水	pH	生活污水经化粪池处理后回用于周边农田灌溉	达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)的旱作物灌溉用水水质标准	已落实
		COD _{Cr}			
		BOD ₅			
		SS			
	地面清洗废水	氨氮	地面清洗废水经隔油沉淀池处理后外排	达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准	已落实
		pH			
		COD _{Cr}			
		SS			
石油类					
噪声污染防治	生产设备	Leq	采用低噪设备、隔声、减震	项目边界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类	已落实
固体废物污染防治	职工	生活垃圾	收集后由环卫部门统一清运处理	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)	已落实
	检修	含油抹布、手套	交由资质单位收集处置	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001及2013年修改单要求)	已落实
		含油废渣			
		清罐油渣			
		隔油池污泥			
零售	废包装袋	收集后交由废品回收单位处理	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单	已落实	

地下水污染防治措施	加油岛地面硬化，装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位采取相应的防渗措施，埋地加油管道应采用双层管道并防腐措施；油罐区外周边设置地下水监测井；加油站等的地下油罐应当使用双层罐并采取建造防渗池等效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染	已落实
环境风险防范措施	工程设施严格按照相关工程设计技术规范设计建设，严格遵守危险化学品贮存销售操作技术规程，采取防火防泄漏防渗控制措施，针对突发环境事件类型编制突发环境事件应急预案并备案。	已落实

表五

验收监测质量保证及质量控制：

表 5-1 监测分析方法及仪器

类别	检测项目	检测方法	仪器名称及编号	检出限
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 604-2017)	GC9790 II 气相色谱仪，JKFX-072	0.07mg/m ³
废水	pH 值	pH 值的测定 玻璃电极法 (GB 6920-1986)	PHS-3C 型 pH 计，JKFX-017	/
	化学需氧量	化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (HJ828-2017)	KHCOD 消解器，JKFX-FZ-013	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 (GB 11901-1989)	AS 220.R1 电子天平，JKFX-065	4mg/L
	石油类	石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ 637-2018)	MAI-50G 红外测油仪，JKFX-009	0.06mg/L
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-2008)	AWA5688 多功能声级计，JKCY-021	/

2、质量保证与质量控制

质量保证与质量控制严格执行国家有关监测技术规范和国家有关采样分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

①验收监测期间，生产工况满足验收监测的规定和要求。

②验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环境保护部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测质量保证按《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)等技术规范要求，进行全过程质量控制。

③验收监测采样和分析人员，均经过持证上岗考核并持有合格证书；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。

④噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大于 0.5dB (A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速>5m/s 停止测试。

⑤样品分析时采取平行双样、空白试验、标准样品等质控措施。实验室样品分析均要求同步完成全程序双空白实验、做样品总数 10%的加标回收和平行双样分析。

⑥监测报告严格执行“三审”制度。

表六

验收监测内容：

表 6-1 检测内容一览表

类别	采样点位	检测项目	检测频次
无组织 废气	厂界上风向 10m 处	非甲烷总烃 同时记录： 气压、气温、风向、 风速	3 次/天， 连续 2 天
	厂界下风向 30m 处		
	厂界下风向 50m 处		
废水	总排口	pH 值、悬浮物、化学需 氧量、石油类	4 次/天， 连续 2 天
噪声	N ₁ 厂界东外 1 米	厂界环境噪声	2 次/天， 昼、夜检测， 连续 2 天
	N ₂ 厂界南外 1 米		
	N ₃ 厂界西外 1 米		
	N ₄ 厂界北外 1 米		

表 6-2 检测期间气象参数

采样点位	采样日期	温度 (°C)	气压 (kPa)	风向	风速
厂界上风向 10m 处	2020.4.15	22.1	99.5	西南	1.6
	2020.4.16	23.4	99.4	西南	1.8
厂界下风向 30m 处	2020.4.15	22.4	99.5	西南	1.6
	2020.4.16	23.6	99.4	西南	1.8
厂界下风向 50m 处	2020.4.15	22.3	99.6	西南	1.7
	2020.4.16	23.5	99.5	西南	1.7

表七

验收监测期间生产工况记录：

2020年4月15日~16日对澧县永丰加油站建设项目进行了现场监测，验收监测期间，主体设施和环保设施运行正常，生产负荷满足验收要求。

验收监测结果：

1、废水

表 7-1 澧县永丰加油站建设项目废水检测结果

采样点位	采样日期	样品状态	检测结果 (mg/L, pH 值: 无量纲)			
			pH 值	悬浮物	化学需氧量	石油类
W1 总排口	2020.4.15	微黄无味微浊	6.73	29	36	0.11
		微黄无味微浊	6.89	20	42	0.08
		微黄无味微浊	6.62	23	32	0.13
		微黄无味微浊	6.93	24	38	0.16
	2020.4.16	微黄无味微浊	6.58	21	39	0.14
		微黄无味微浊	6.72	25	34	0.18
		微黄无味微浊	6.87	26	31	0.09
		微黄无味微浊	6.79	28	37	0.12
参考《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级标准			6-9	70	100	5
达标情况			达标	达标	达标	达标

根据监测结果，本项目外排废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级标准要求，实现达标排放。

2、废气

表 7-2 澧县永丰加油站建设项目无组织废气检测结果

采样点位	采样日期	时均浓度 (mg/m ³)		
		非甲烷总烃		
		第一次	第二次	第三次
厂界上风向 10m 处	2020.4.15	1.33	1.50	1.45
	2020.4.16	1.68	1.70	1.69
厂界下风向 30m 处	2020.4.15	2.05	3.67	2.11
	2020.4.16	3.73	2.24	2.33
厂界下风向 50m 处	2020.4.15	2.57	3.80	2.28
	2020.4.16	3.70	2.18	3.79
参考《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值		4.0		
达标情况		达标		

根据验收监测数据，厂界无组织废气各项监测因子均达标排放。

2、噪声

表 7-4 澧县永丰加油站建设项目厂界环境噪声检测结果

检测点位	检测日期	检测结果 Leq[dB(A)]	
		昼间	夜间
N ₁ 厂界东外 1 米	2020.4.15	53.2	43.7
	2020.4.16	53.7	43.2
N ₂ 厂界南外 1 米	2020.4.15	54.2	45.6
	2020.4.16	54.6	45.1
N ₃ 厂界西外 1 米	2020.4.15	57.8	46.7
	2020.4.16	57.2	47.4
N ₄ 厂界北外 1 米	2020.4.15	54.1	43.8
	2020.4.16	54.9	44.2
参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类标准		60	50

监测期间，昼间噪声最大值出现在厂界西，为 57.8dB(A)，本项目夜间噪声最大值出现在厂界西 47.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准限值要求，实现达标排放。

3、固体废物

经现场调查，本项目在运营期产生的生活垃圾收集后交当地环卫部门处置，废包装物收集后交由废品回收单位处理，产生的废油、油泥等危险废物设置危废暂存间，签订危废处置协议，经统一收集暂存后定期交由资质的单位处置。本项目固废做到了减量化、无害化、资源化，满足相关管理要求。

5、总量核算

根据环评及环评批复文件要求，本项目不设置总量控制指标。

表八

验收监测结论:

澧县永丰加油站建设项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。公司环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。

本验收检测结论是针对 2020 年 4 月 15 日~16 日生产及环境条件下开展验收检测所得出的结论。

- 1、该项目验收监测期间生产负荷满足验收监测要求。
- 2、该项目验收监测期间生产设施及环保设施运行正常。
- 3、各类污染物及排放情况:

(1) 废水

根据监测结果，本项目外排废水经隔油沉淀池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的一级标准要求，实现达标排放。

(2) 废气

根据现场验收监测结果，本项目外排废气非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求，实现达标排放。

(3) 噪声

监测期间，昼间噪声最大值出现在厂界西侧，为 57.8 dB（A），本项目夜间噪声最大值出现在厂界西 47.4dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求，实现达标排放。

(4) 固体废物

本项目营运过程中产生的含油抹布、手套、含油废渣、清罐油渣分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位收集处置，便利店购物产生的包装纸箱等，收集后交由废品回收单位处理，员工生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

(5) 总量控制

根据环评及环评批复文件要求，本项目不设置总量控制指标。

(6) 总体结论

澧县永丰加油站建设项目遵守国家相关法律法规规定，经现场检查和采样监测，废气监测结果、噪声监测结果，固废处置措施均达到验收执行标准要求。各项环保设施均已按照环评结论和环评批复的要求得到落实，企业环境保护设施管理到位，建议对该项目予以验收。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，该项目不存在暂行办法中所列九种不得提出验收合格的情形。

表 8-1 暂行办法对照核查表

编号	《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形	本项目是否存在此项情况	符合情况
1	未按环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；	本项目按要求编制了环境影响报告表，并按照审批部门审批决定要去建成了环保设施，环保设施与主体工程同时投产使用。	符合
2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；	本项目废气、噪声所有监测因子均符合相关标准要求。	符合
3	环境影响报告表（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告表（表）或者环境影响报告表（表）未经批准的；	根据现场踏勘，本项目未发生重大变动情况。	符合
4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；	建设过程中无造成重大环境污染，也没有造成重大生态破坏。	符合
5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；	本项目不存在上述情形	符合
6	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；	本项目整体工程一次建成。	符合
7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；	本项目已缴纳罚款。	符合

8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；	验收监测资料齐全，验收结论明确。	符合
9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。	该项目未出现此项情形。	符合

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	澧县永丰加油站建设项目				项目代码	F-5265		建设地点	湖南省澧县如东镇梅家港居委会梅家港路55号			
	行业类别（分类管理名录）	“四十 社会事业与服务业”中的“124、加油、加气站”中的“新建、扩建”				建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造		项目厂区中心经度/纬度				
	设计生产能力	年零售石油65吨				实际生产能力	与设计一致		环评单位	湖南大自然环保科技有限公司			
	环评文件审批机关	常德市生态环境局澧县分局				审批文号	常环建（6）[2020]33号		环评文件类型	报告表			
	开工日期	2007年1月				竣工日期	2020年5月		排污许可证申领时间				
	环保设施设计单位	/				环保设施施工单位	/		本工程排污许可证编号				
	验收监测单位	湖南精科检测有限公司				环保设施监测单位			验收监测时工况	>75%			
	投资总概算（万元）	60				环保投资总概算（万元）	15		所占比例（%）	25			
	实际总投资	60				实际环保投资（万元）	15		所占比例（%）	25			
	废水治理（万元）	2.5	废气治理（万元）	4	噪声治理（万元）	0.5	固体废物治理（万元）	1	绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	7	
新增废水处理设施能力					新增废气处理设施能力			年平均工作时	365d				
运营单位					运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			914307236895467230	验收时间	2020年6月			
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量（1）	本期工程实际排放浓度（2）	本期工程允许排放浓度（3）	本期工程产生量（4）	本期工程自身削减量（5）	本期工程实际排放量（6）	本期工程核定排放总量（7）	本期工程“以新带老”削减量（8）	全厂实际排放总量（9）	全厂核定排放总量（10）	区域平衡替代削减量（11）	排放增减量（12）
	废水												
	化学需氧量												
	氨氮												
	石油类												
	废气												
	二氧化硫												
	烟尘												
	工业粉尘												
	氮氧化物												
	工业固体废物												
与项目有关的其他特征污染物													

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

建设单位验收监测期间工况证明

验收监测期间，我单位主体设施和环保设施运行正常，生产负荷满足验收要求。

验收监测生产负荷表

日期	产品名称	设计能力	实际能力	生产负荷
2020.4.15	零售柴油、汽油 成品油	汽油 40t/a 柴油 25t/a	汽油 0.0912t/d 柴油 0.057t/d	83%
2020.4.16			汽油 0.088t/d 柴油 0.055t/d	80%

【工作制度：每年生产天数为 365 天，每日工作时间 24 小时，合计全年工作 8760h，折算设计产能为汽油 0.11t/d、柴油 0.068t/d】

声明：特此确认，本说明所填写内容及所附文件和材料为真实有效的。我的单位承诺对所提交材料的真实性负责，并承担内容不实之后果。

澧县永丰加油站（公章）

2020 年 4 月 16 日

建设项目竣工环境保护验收监测委托书

湖南精科检测有限公司：

我单位澧县永丰加油站建设项目已竣工。本项目已按照环境保护行政主管部门的审批要求，严格落实各项环境保护措施，污染防治设施与主体工程同时投入试运行。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等的有关规定，特委托你公司对本项目进行环境保护验收监测。

委托单位（公章）：澧县永丰加油站

委托时间：2020 年 04 月 10 日

附件 2 营业执照



常德市生态环境局

常环建(6)(2020)33号

关于澧县永丰加油站建设项目 环境影响报告表的批复

澧县永丰加油站:

你单位申报的《澧县永丰加油站建设项目环境影响报告表》和《关于申请环境影响报告表审批的请示》已收悉,公示期间无反对意见。根据该项目环评报告表结论和专家审查意见,经研究,现批复如下:

一、澧县永丰加油站位于湖南省澧县如东镇梅家港居委会梅家港路55号,于2007年建成投产。现建设单位主动补办环境影响评价手续,项目地理坐标为北纬29.689161,东经111.938136。该加油站主要工程内容包括1个罩棚、2台加油机,储罐区建有2个地埋卧式双层防腐罐,并配套建有卧式双层防腐罐防渗池、卸油及加油油气回收系统、以及便利店等公辅工程,现拟增加投资,配套完善相关的环保、风险防范设施。项目总投资60万元,其中环保投资15万元,总占地面积600m²,建筑面积261m²,年零售柴油25吨,汽油40吨。项目符合国家

产业政策，同意办理环评手续。

二、建设单位在项目运营过程中要强化管理，按环评要求认真落实各项环保措施，确保污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1. 营运期废水：项目采用雨污分流制。生活污水经化粪池预处理回用于周边农田，不外排；场地冲洗废水与洗车废水经隔油沉淀池处理达标后通过厂区雨水沟排入西侧沟渠，最终汇入泔水，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。

2. 营运期废气：加强油品运输车辆的管理，严格按规操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。油气回收系统执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值 $25\text{g}/\text{Nm}^3$ 标准，非甲烷总烃厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

3. 营运期噪声：项目选择低噪声和防爆型设备，采取合理的降噪减振措施。边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4. 营运期固废：落实各项固废收集处置措施。设置危险废物暂存间，项目运营中产生油罐废渣、隔油池废油等危险废物须集中收集暂存后交由有资质的单位处置；生活垃圾和废弃含油抹布集中收集后交由当地环卫部门处理。

5. 做好环境风险事故防范措施，加强运输、贮存、运营过程中的安全管理工作，采取防渗漏和防渗漏检测措施。建立应急机构和风险防范体系，制定事故风险防范措施和切实可行的环境风险应急预案，建立健全各项环境管理制度，减少事故率，降低事故危害程度。

三、项目竣工后，你公司要按照环保部规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并向社会公开，合格后方可投入生产或使用。澧县生态环境保护综合行政执法局负责日常监管。



抄送：澧县生态环境保护综合行政执法局

附件4 应急预案备案表

澧县永丰加油站突发环境事件应急预案

第一部分 突发环境事件应急预案备案表

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	澧县永丰加油站	机构代码	914307236895467230
法定代表人	唐直义	联系电话	13469167418
联系人	唐直义	联系电话	13469167418
传真	—	电子邮箱	—
地址	湖南省澧县如东镇梅家港居委会梅家港路55号 (北纬29.689161, 东经111.938136)		
预案名称	澧县永丰加油站突发环境事件应急预案		
风险级别	一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)]		
预案签署人	<p>本单位于2020年4月20日签署发布了突发环境事件应急预案, 备案条件具备, 备案文件齐全, 现报送备案。 本单位承诺, 本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实, 无虚假, 且未隐瞒事实。</p> <p style="text-align: right;">预案制定单位(公章): 澧县永丰加油站</p>		
突发环境事件应急预案备案文件目录	唐直义	报送时间	2020.4.26
备案意见	<p>1、突发环境事件应急预案备案表; 2、环境应急预案及编制说明: 环境应急预案(签署发布文件、环境应急预案文本); 编制说明(编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明); 3、环境风险评估报告; 4、环境应急资源调查报告; 5、环境应急预案评审意见。</p> <p>该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2020年4月26日收讫, 文件齐全, 予以备案。 有效期从2020年4月26日起至2023年4月25日止, 有效期三年。</p> <p style="text-align: right;">备案受理部门(公章) 2020年4月26日</p>		
备案编号	4307232020372		
报送单位	澧县永丰加油站		
受理部门负责人	谭俊峰	经办人	谭思忠、张小雨

危险废物处理协议

甲方：澧县永丰加油站

地址：

乙方：常德科瑞再生资源有限公司

地址：澧县高新技术产业开发区

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及其他环境保护法律、法规的规定，为了加强对危险废物的规范管理，减少危险废物对人类及周边环境的污染和影响，甲方在生产过程中所产生的危险废物不可随意堆放、弃置或者转移。受甲方委托，负责处理甲方所产生的危险废物。为确保双方合法利益，维护正常合作，经甲乙双方友好协商特签订如下协议，由双方共同遵照执行。

一、甲方协议义务：

- 1.1 甲方生产过程中所产生的危险废物（4.1条所列）等对环境有影响的危险废弃物连同包装物，按照环保部门的要求，必须全部交予由合法资质的单位（乙方）进行收集回收处理，协议内不得将部分或全部废物自行处理或者交由第三方处理。
- 1.2 甲方应将待处理的危险废物分类集中摆放，并尽可能向乙方提供危险废物装车所需的提升机械（叉车等），以便于乙方装运。
- 1.3 甲方保证提供给乙方的危险废物中不出现品种未列入本协议的异常情况，人为混和装入同一容器，以及其他违反危险废物包装的国家标准、行业标准的异常情况。本着友好合作的原则，由乙方业务人员与甲方人员进行协调沟通。如异常情况对乙方运输、分拣、处理、处置等不会造成不良影响的，乙方可予以接收。
- 1.4 甲方要求将协议以外的废物交予乙方处理处置的，甲方应提前通知乙方，并与乙方签订补充协议；在补充协议签订后，乙方才可以开展收运工作。

二、乙方协助义务：

- 2.1 乙方在协议的存续期间内，必须保证所持相关证件合法有效。
- 2.2 乙方在接到甲方废物转移的通知后，在无特殊情况的前提下，两个自然日

内乙方对该批次的废物进行确认，双方无异议的情况下，将废物进行现场交接转移（乙方如发现废物类别与合同范围有别的和质量发生变化时，乙方有权向甲方提出终止合同）。

2.3 乙方应具备处理危险废物所需的条件和设施，保证各项处理条件和设施符合国家法律、法规对处理危险废物的技术要求，并在运输和处置过程中不产生二次污染。

2.4 乙方自备运输车辆、装卸人员，按双方商议的计划到甲方收取危险废物，不影响甲方正常生产、经营活动。

2.5 乙方收运车辆以及司机及装卸员工，应在甲方厂区内文明作业，作业完毕后将其作业范围内清理干净，并遵守甲方的相关环境以及安全管理规定。

三、危险废物的计量：

3.1 过磅时，甲乙双方工作人员应严格区分不同种类的废物，分别称重。

3.2 对于需要与浓度或含量来计价的有价废物，以双方收运时的现场取样的浓度或含量标准，该样应送至乙方或双方认可的机构进行检测。

四、危险废物种类、数量以及收费凭证及转接责任：

4.1 甲方委托乙方回收处置废物种类：1、危险废物油HW08 (900-24-08)

4.2 若发生意外或者事故，废物由甲方交乙方签收之前，责任由甲方自行承担；废物由甲方交乙方签收之后，责任由乙方自行承担。但由于甲方违反 1.3 条款规定而造成的事故，由甲方负责。甲方如在本合同期内有私自处理和利用其它方式处理行为所造成的后果和影响不在乙方负责范围之内。

五、产生费用的结算性质为：收费和付费处理

5.1 甲方所产生的危险废物在无回收利用价值的情况下，乙方进行收费回收处理或处置。

5.2 甲方所产生的危险废物有一定的回收利用价值时，乙方可以付费进行回收。

六、协议的免责：

6.1 在协议存续期间内甲乙任何一方因不可抗力或政府的原因，不能履行本协议时，应在不可抗力的事件发生之后三日内向对方书面告知不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由。

6.2 在取得相关证明之后，本协议可以不履行或者需要延期履行、部分履行，

并免于承担违约责任。

七、协议争议的解决：

本协议未尽事宜和因本协议发生的争议，由双方友好协商解决或另行签订补充协议；若双方协商未达成一致，协议双方可以向被告所在地人民法院提起诉讼。

八、协议的违约责任：

8.1 协议双方中一方违反本协议的规定，守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为，造成守约方经济以及其他方面损失的，违约方应予以赔偿。

8.2 对不符合本协议约定的废物，乙方认为可以接收处理的，应在处理前与甲方就这些废物的价格进行协商，协商一致后才可以处理，协商不成的不予接收或退回。产生的费用甲方承担。

8.3 若甲方故意隐瞒乙方收运人员，或者存在过失，造成乙方运输、处理危险废物时出现困难、事故，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的相关经济损失并承担相应法律责任，乙方有权根据《中华人民共和国环境保护法》以及其他环境保护法律、法规规定上报环境保护行政主管部门。

8.4 协议双方中一方逾期支付处理费、运输费或收购费，除承担违约责任外，每逾期一日按应付总额 1% 支付滞纳金给协议另一方。

8.5 在协议的存续期间内，甲方将其生产经营过程中产生的危险废物连同包装物自行处理、挪坐他用或转交第三方处理，乙方除追究甲方违约责任外，并根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及其他环境保护法律、法规规定上报环境保护行政主管部门。乙方不承担由此产生的经济损失以及相应的法律责任。

九、协议其他事宜：

9.1 本协议的生效和有效期为一年，2020年4月8日到2021年4月7日止，合同期满后双方协商续签合同。

9.2 达成协议后，甲方应付给乙方处置费 肆仟 元。

9.3 乙方账户：常德科瑞再生资源有限公司

账 号：4305 0168 7436 0000 0375

开户行：中国建设银行股份有限公司澧县支行

9.4 本协议一式三份，双方各持一份，另一份交环保局备案。

甲方（盖章签字）：



乙方（盖章签字）：



常德科瑞再生资源有限公司

代表人：

唐宇

联系电话：13342561671

代表人：

宋双

联系电话：15200627755

日期：2020年4月8日

日期：2020年4月8日

危险废物经营许可证

编号：湘环（许决）字第（2019001）号

持证单位：常德科瑞再生资源有限公司

法人代表：宋国权

地址：湖南省澧县经济开发区

经营方式：收集、贮存（限非工业产生）

经营范围：HW08（900-214-08、900-220-08）

经营规模：HW08（10000吨/年）

经营期限：1年

有效期：2019年09月27日至2020年09月26日

发证机关：（盖章）

2019年09月27日



营业执照

副本编号: 1-1

(副本)

统一社会信用代码 91430723MA4Q03YTXP

名称 常德科瑞再生资源有限公司
 类型 有限责任公司(自然人独资)
 住所 湖南省澧县澧西街道办事处居委会经济开发区乔家河路城头山水工机械制造有限公司内3栋西200号
 法定代表人 宋国权
 注册资本 叁拾万元整
 成立日期 2018年09月28日
 营业期限 长期
 经营范围 再生资源回收与批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2018 9 28 年 月 日

1. 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行通知;
 2. 《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需向社会公示。

<http://hn.gsxt.gov.cn>

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

湖南金泰安全评价有限责任公司

2018C-1-wh056

澧县永丰加油站

经营危险化学品

安全评价报告

湖南金泰安全评价有限责任公司

证书编号: APJ-

二〇一八年



6 评价结论

澧县永丰加油站，采用安全检查表进行安全评价，共计有八个安全评价单元，总计 29 项，其中 29 项合格，无不合格项。

评价组认为：澧县永丰加油站，有关证照文书齐全，安全管理制度和管理组织齐全，站长培训持证上岗，总平面布置基本合理，油罐及相关工艺系统基本达到规范要求，消防、防雷、防静电等安全设施系统经有关部门检测基本达标。

我们希望该站平日常抓安全管理制度的落实，全面建立预警机制和应急预案，全面提高从业人员安全意识和业务素质；对检测中不符合项目，应进一步整改和完善；以保证该站从人、机、物、环的整体上，处于极佳的安全状态。

综上所述，评价组认为：澧县永丰加油站汽油、柴油储存、经营符合安全要求。

湖南金泰安全评价有限责任公司

2018年5月16号



澧县永丰加油站建设项目
环境保护“三同时”工作

总 结 报 告

建设单位：澧县永丰加油站

一、项目概况

澧县永丰加油站位于湖南省澧县如东镇梅家港居委会梅家港路 55 号，北纬 29.689161，东经 111.938136，于 2007 年建成投产，现建设单位主动补办环境影响评价手续。该加油站总投资 60 万元，用地面积为 600m²，建筑面积 261m²。加油站设卸油及加油油气回收系统，站区设加油机 2 台，其中 0#柴油和 92#汽油加油机为两枪。埋地油罐 2 个（其中一个 30m³ 为柴油油罐，另一个 30m³ 为汽油油罐），折合汽油油罐总容积为 45m³（柴油罐容积折半计算），年销油量约 65 吨（其中汽油 40 吨）。

本项目由业主自主组织验收，业主委托湖南精科检测有限公司进行验收监测。湖南精科检测有限公司于 2020 年 4 月 15 日~16 日对项目进行验收监测，经现场核实，本项目建设内容（工程组成）如下：

1、项目建设内容

表 1 项目建设内容一览表

工程类别	项目名称	建设内容及规模	验收阶段对比分析
主体工程	加油岛	设 2 台单枪油气回收型加油机；地面水泥硬化	一致
	罩棚	钢架结构，投影面积 121m ² ，高 8m	一致
	储罐区	30m ³ 汽油罐 1 个（双层防腐罐）、30m ³ 柴油罐 1 个（双层防腐罐），配套钢筋混凝土防渗池	一致
辅助工程	站房	建筑面积 110m ² ，两层砖混结构主要设置便利店、办公室、休息室	一致
	辅助用房	一层砖混结构，主要为配电间、发电间，建筑面积为 30m ²	一致
	安全防护	设静电接地系统并设专用静电接地报警器，储油罐防雷防静电接地与电气设备的工作、保护接及信息系统的接地宜共用接地装置；实体围墙砖混结构，墙高 2.0m	一致
公用工程	给水	从自来水管接入	一致
	排水	项目生活污水经化粪池处理后回用于周边农田灌溉；场地清洗废水经隔油沉淀池处理后由雨水沟汇入西侧沟渠	一致
	供电系统	从农村电网电源引至站内配电室。设配电室、柴油发电机组	一致

	消防	加油区配置不少于 2 具 4kg 手提式干粉灭火器 2 台加油机，或 1 具 4kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器；地下储罐区应配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器；配置灭火毯不少于 2 块、沙子 8m ³ 消防砂箱	一致
环保工程	废水	生活污水经化粪池预处理回用于周边农田；场地冲洗废水经隔油沉淀池处理达标后经雨水沟排入西侧沟渠，最终进入污水	一致
	废气	安装卸油油气回收装置、分散式加油油气收系统一套； 渗漏检测在线监测系统	一致
	固废	生活垃圾交由环卫部门统一清运处理，日产日运；隔油池废油、含油手套、抹布、含油废渣、清洗废液等危险废物，经收集桶收集后暂存在危废暂存间，定期交由已取得危险废物处置资质的公司进行处置	一致
	噪声	加油站进出口设置限速、禁鸣标志和减速坡，噪声设施安装减噪措施	一致
	地下水	加油岛地面硬化，装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位采取相应的防渗措施，埋地加油管道应采用双层管道并防腐措施；油罐区外周边设置地下水监测井；加油站等的地下油罐应当使用双层罐并采取建造钢筋混凝土防渗池等效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染	一致
	风险防范措施	设置紧急切断系统，在事故状态下迅速切断加油泵电源；油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统；加油岛端部的加油机附近应设防撞柱（栏）；设置消防废水事故应急池（5m ³ ）；制定岗位操作规范；编制突发环境事件应急预案	未设置事故应急池

澧县永丰加油站建设项目于 2019 年 10 月由湖南大自然环保科技有限公司完成其环境影响评价报告表并通过评审，于 2020 年 4 月 9 日以常环建（6）[2020]33 号予以批复。已建成的整个项目在施工期和运行期严格执行项目环评要求和落实环保“三同时”制度。

二、环评批复落实情况

项目环评批复要求及落实情况见表 2。

表 2 项目环评批复要求及落实情况一览表

编号	环评及批复要求	落实情况	对比分析
1	<p>营运期废水：项目采用雨污分流制。生活污水经化粪池预处理后回用于周边农田灌溉，不外排；场地冲洗废水与洗车废水经隔油沉淀池处理达标后通过西侧沟渠排入泔水，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准。</p>	<p>项目采用了雨污分流制，建设了雨水导流沟。项目生活污水经化粪池预处理后回用于周边农田灌溉，不外排；清洗废水经隔油沉淀池处理达标后外排，经现场监测结果表明，项目外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准，可以做到达标排放。</p>	一致
2	<p>营运期废气：加强油品运输车辆的管理，严格按规操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。油气回收系统执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值 25g/Nm³ 标准，非甲烷总烃厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。</p>	<p>营运期废气：企业通过加强油品运输车辆的管理，并严格按规操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并建立了台账。企业进行了油气回收系统的检测，并检测达标，经过现场监测，项目厂界非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。</p>	一致
3	<p>项目选择低噪声和防爆型设备，采取合理的降噪减振措施。边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类。</p>	<p>项目选用了低噪声和防爆型设备，采取了合理的降噪减振措施。经现场监测，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值要求。</p>	一致
4	<p>落实各项固废收集处置措施。设置危险废物暂存间，项目运营中产生油罐废渣、隔油池废油等危险固废须集中收集暂存后交由有资质的单位处置；生活垃圾和废弃含油抹布集中收集后交由当地环卫部门处理。</p>	<p>企业落实了各项固废收集处置措施。设置了危险废物暂存间，集中收集油罐废渣、隔油池废油等危险固废，并签订了危废协议，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾和废弃含油抹布集中收集后交由当地环卫部门处理。</p>	一致
5	<p>做好环境风险事故防范措施，加强运输、贮存、运营过程中的安全管理工作，采取防渗漏和防渗漏检测措施。建立应急机构和风险防范体系，制定事故风险防范措施和切实可行的环境风险应急预案，建立健全各项环境管理制度，减少事故率，降低事故危害程度。</p>	<p>企业做好了环境风险事故防范措施，加强了运输、贮存、运营过程中的安全管理工作，采取了防渗漏和防渗漏等检测措施。建立了应急机构和风险防范体系，制定了事故风险防范措施和切实可行的环境风险应急预案并备案，建立健全了各项环境管理制度。</p>	一致

三、环保机构设置、规章制度制订及落实情况

1、为保证环保制度的落实与执行，澧县永丰加油站每月组织一次以上的安全、环保、消防、卫生大检查，以查思想意识、查制度落实、查隐患为主要目的。对设备、设施的非正常运转，实行“谁当班、谁主管、谁负责”，对检查情况及时通报，及时整改。每月对环境管理情况，挂牌通报奖罚。

2、环保管理方案和措施比较切实可行。建立了《环境保护日常管理制度》，明确了各部门负责人及环保人员的岗位职责，同时制定了有关环保设施的操作规程及运行记录和维护保养等制度。

3、建立健全了环保设施运行台帐，所有资料文件及时归档，环境保护档案管理规范。并逐步完善的环保档案管理制度，对环保法规文件、环评资料、环保设施资料、环境监测记录等档案进行分门别类的存档。

4、严格的按照环境影响评价报告表要求，建设了相关环境保护设施。

5、在项目建设期间和试生产阶段没有发生与环保有关的污染事故，和当地的百姓关系处理比较融洽。

澧县永丰加油站在试运行过程中强化各项污染治理设施的日常管理和调试，建立健全了内部环保管理机构和管理制度，确保污染治理设施正常运行，通过 2020 年 4 月 15 日~16 日湖南精科检测有限公司对项目现场采样并对样品进行分析得出，本项目在监测期间生产设施及环保设施运行正常，各类污染物排放浓度均满足环评批复要求。

综上所述，澧县永丰加油站建设项目从建设到竣工再到试运行生产，严格秉承环保理念，始终将环境保护工作放在首位，认真落实环保部门所提出的的环保要求。我们将以本次环保验收为契机，立足长远，不断完善，扎扎实实的抓好环保设施的长效管理，将环保工作纳入依法治理的轨道。

此报告有不足之处，请各级环保部门领导批评指正。

澧县永丰加油站

2020 年 5 月 21 日

澧县永丰加油站 关于环保管理机构的任命

为了认真贯彻执行国家的环境保护有关法律法规政策的规定，我公司任命以下人员为环境保护领导小组成员：

组 长：唐直义

环保专干：唐军

澧县永丰加油站

2020 年 5 月

澧县永丰加油站 企业环境保护管理制度

第一条 我公司环境保护工作坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则；坚持推行清洁生产，实行污染物达标排放和污染物总量控制的原则；坚持环境保护工作作为评选先进的必要条件，实行一票否定制。

第二条 环境保护工作的组长应对本公司环境保护工作实施统一监督管理，是环境保护第一责任人。

第三条 公司的环境保护工作具体由工作小组的负责人员安排、管理，负责对公司的人员安排、物资组织与工作协调。

第四条 公司环保工作小组必须监督公司各岗位工作人员严格按照公司的生产工艺操作流程操作。

第五条 公司生产运营中，如果环保安全事故发生，应立即向公司环保工作小组组长报告。组长应及时按照公司环保应急预案进行处置。


附图




附图 1 项目地理位置图



附图 2 项目排水走向图

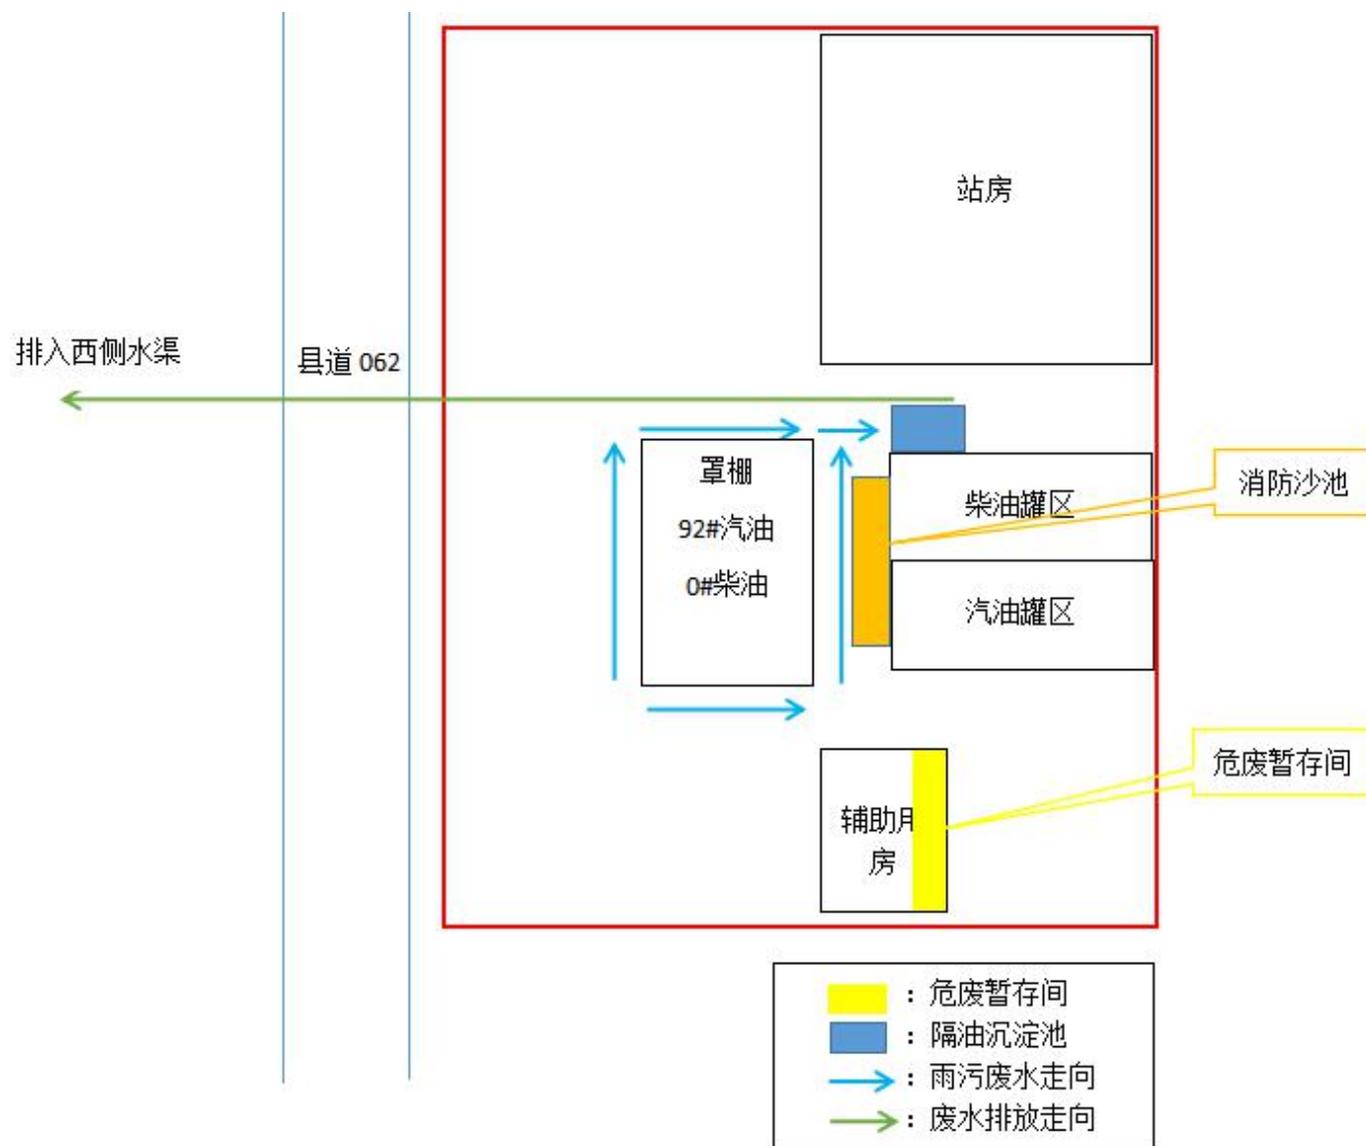

附图 3 项目平面布置图

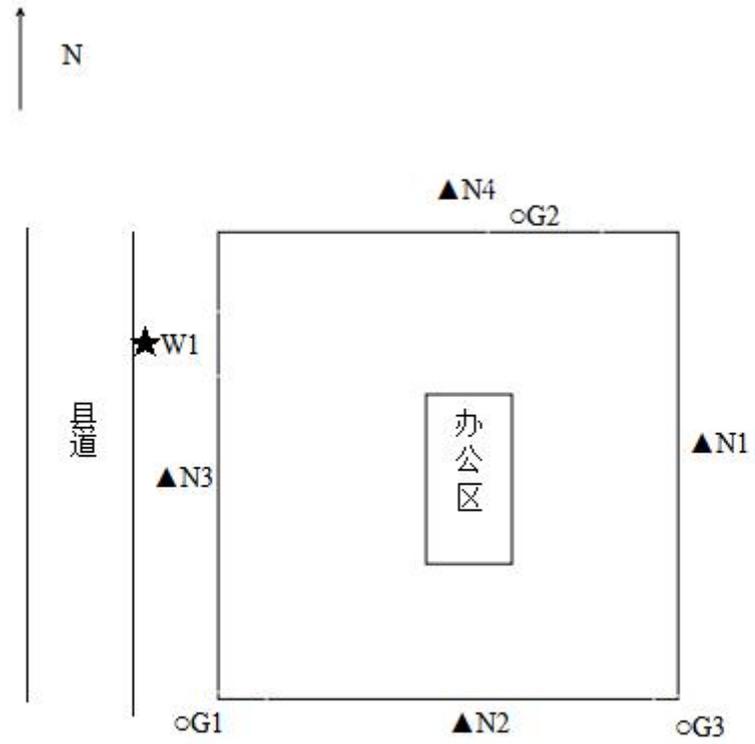

注：“○”为无组织废气监测点位，“▲”为噪声监测点位，“★”为废水监测点位。

附图 4 监测点位示意图



厂界上风向 10m 处



厂界下风向 30m 处



厂界下风向 50m 处



总排口



N₁ 厂界东外 1 米



N₂ 厂界南外 1 米



N₃ 厂界西外 1 米



N₄ 厂界北外 1 米

附图 5 现场监测照片



危废暂存间



托盘盛放



导流沟




消防器材



隔油沉淀池



隔油沉淀池

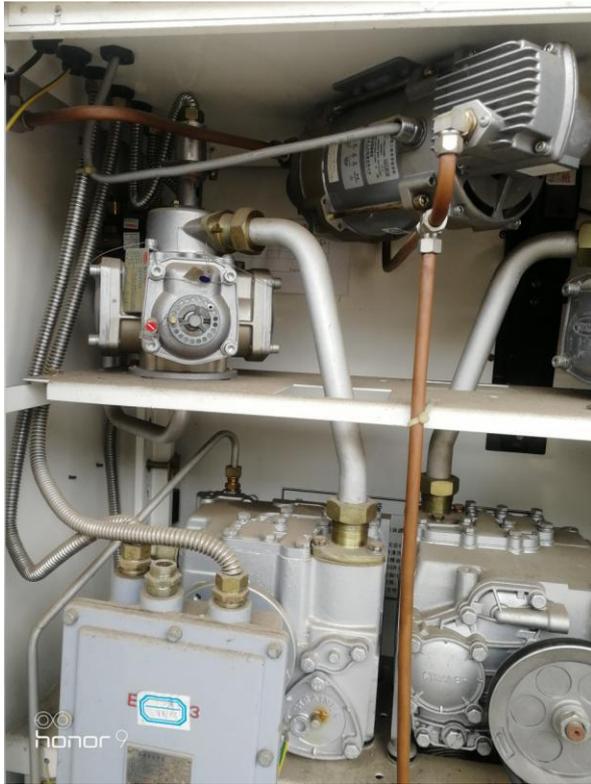

油气回收设施



油气回收设施



消防砂



吸油棉

附图6 项目现场图

澧县永丰加油站建设项目 其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，现将澧县永丰加油站建设项目的环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

澧县永丰加油站建设项目（以下简称本项目）很好地落实了环评中要求的污染防治设施，符合“三同时”相关管理规定。

本项目的环境保护设施均按相关法律法规、标准要求纳入项目的初步设计，同时项目单独的环境保护篇章，所涉及的设施符合环境保护设计规范要求，并在建设改造过程中对防止污染和生态破坏的措施以及环境保护措施投资概算等内容进行了落实，项目设计阶段，符合国家现行法律法规、行业标准要求。

1.2 施工简况

为确保项目环保设施项目建设进度，澧县永丰加油站对于环保专项资金做了充足预算，并将环保设施的建设细则纳入与施工单位签署的合同中，并在建设过程中积极组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中突出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

本项目于2020年3月25日委托湖南精科检测有限公司对本项目进行竣工环境保护验收。

2020年4月20日湖南精科检测有限公司组织技术人员对该项目进行了现场勘查，并收集了相关工程资料，确定验收范围为：澧县永丰加油站建设项目的主体工程（包括加油岛、罩棚、储罐区）、辅助工程（站房、危废间、隔油沉淀池等）的废

水、废气、噪声、固废环保设施的建设、调试、管理及其效果和污染物排放等情况开展的查验、监测等环境影响评价报告和批复规定的环境保护措施全部内容。

根据本项目实际建成情况，并参考环评报告及其批复内容，湖南精科检测有限公司于2020年3月25日编制了验收监测方案。

根据本项目调试期生产情况，本次验收于2020年4月15日~16日对本项目进行了现场监测及环境管理检查，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目的验收监测报告。

1.4 公众反馈意见及处理情况

无。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

公司安全环保部是公司环境保护管理的归口部门，负责指导全公司环境保护管理，并监督执行情况，由本单位相关负责人组成，行使公司环境保护管理机构的主要职责。

公司现行的环境管理制度有：《环境保护管理规定》、《环境保护分工管理规定》、《澧县永丰加油站环保培训管理办法》、《澧县永丰加油站固体废物仓库管理规定》等。

(2) 环境监测计划

根据本项目正常工况下污染物排放情况，企业制定了本项目环境监测方案。

本次验收现场检查，公司按照该监测方案进行监测，符合相关要求。

表1 项目环境监测计划一览表

内容		监测点位	监测因子	监测频率	执行标准
环境质量监测	大气环境	项目所在地厂址中心及下风向最近居民敏感点	非甲烷总烃	一年一次	《大气污染物综合排放标准详解》

	声环境	厂界四周	连续等效声级	一年一次	项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
污染源监测	噪声	厂界外 1m, 厂界四周各一个点	连续等效声级	一年一次	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	废水	总排污口	pH、CODcr、SS、石油类	一年一次	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准
	废气	厂界上风向、下风向处	非甲烷总烃	一年一次	执行《加油站大气污染物排放标准》及《大气污染物综合排放标准》非甲烷总烃无组织标准限值

2.2 配套措施落实情况

- (1) 区域削减及淘汰落后产能
无。
- (2) 防护距离控制及居民搬迁
无。

2.3 其他措施落实情况

无。

3 整改工作情况

无。
